

Iteración 1

Proyecto AUTOVIDA

Agenda digital accesible para alumnado con NEAE

26 de octubre — 11 de noviembre de 2026 · Sprint 1 cerrado

Qué íbamos a construir

- Desplegar la **arquitectura base**: cliente Flutter, API FastAPI y PostgreSQL.
- Completar la **gestión de cuentas, roles y asociaciones** entre alumnado, tutores y personal.
- Una primera versión de **creación y asignación de tareas**.
- Dejar operativas las **vistas de administración**.

No se entrega producto terminado: es un prototipo desechable, pensado para enseñar el planteamiento y abrir la conversación con el centro.

Alcance previsto

67 PH

38 puntos de las HU-01 a HU-15

29 puntos de despliegue

Lo que de verdad pasó

El alcance creció un

73 %

durante el sprint, y aun así se cerró entero.

Alcance del sprint	Puntos
Previsto al planificar	67
4 historias adelantadas	+14
14 historias nuevas	+35
Total ejecutado	**116**

Por qué creció: apareció el aula

Durante el sprint se detectó que el modelo no contemplaba **la clase como entidad**. Sin ella no había forma de que un alumno se buscara dentro de su aula al iniciar sesión, tal como se planteó en clase con el docente.

14 historias nuevas

- Crear, modificar y eliminar clases.
- Asignar profesorado y alumnado a un aula.
- Crear, consultar, modificar y eliminar tareas de una clase entera.
- Cambiar el avatar de un alumno.

4 historias adelantadas

- Consultar tareas por fecha: alumno, tutor y personal.
- Crear tarea por parte del alumno.

Se adelantaron porque otras historias dependían de ellas para poder avanzar.

Qué se entregó

- **32 historias de usuario** cubiertas por la aplicación, verificadas una a una contra la API en ejecución.
- **Pruebas de aceptación superadas** en backend y en frontend.
- Arquitectura completa funcionando en local con un único guion de arranque.
- Primera auditoría de accesibilidad del prototipo.

Pendiente: la revisión con el centro. Sus observaciones pueden generar correcciones que se priorizarán para el sprint 2.

Área	Historias
Administración	13
Personal del centro	11
Tutores y familias	3
Alumnado	3
Autenticación	2
Total	**32**

Cómo nos organizamos

Dos subequipos

Frontend — Pablo Hernández, José Rodríguez y Julián Carrión, que además ejerce de gestor de accesibilidad.

Backend — Yeray Rodríguez, Pablo de la Torre, Miguel Ángel Luque y Amine Azzammouri.


Una plantilla común

Cada historia se descompone siempre en las mismas **8 subtareas**: base de datos, endpoint, acceso a datos, diseño de interfaz, implementación, conexión con la API y las dos pruebas de aceptación.

Integrante	Tareas	Al día
José Rodríguez Fernández	43	3,31
Julián Carrión Tovar	43	3,31
Pablo Hernández Ibáñez	42	3,23
Yeray Rodríguez Navas	32	2,46
Pablo de la Torre Roldán	32	2,46
Miguel Ángel Luque Gómez	32	2,46
Amine Azzammouri	32	2,46
Total	**256**	**2,81**

Ritmo de aceptación de tareas en 13 días laborables, no velocidad en puntos.

Lo que costó en horas

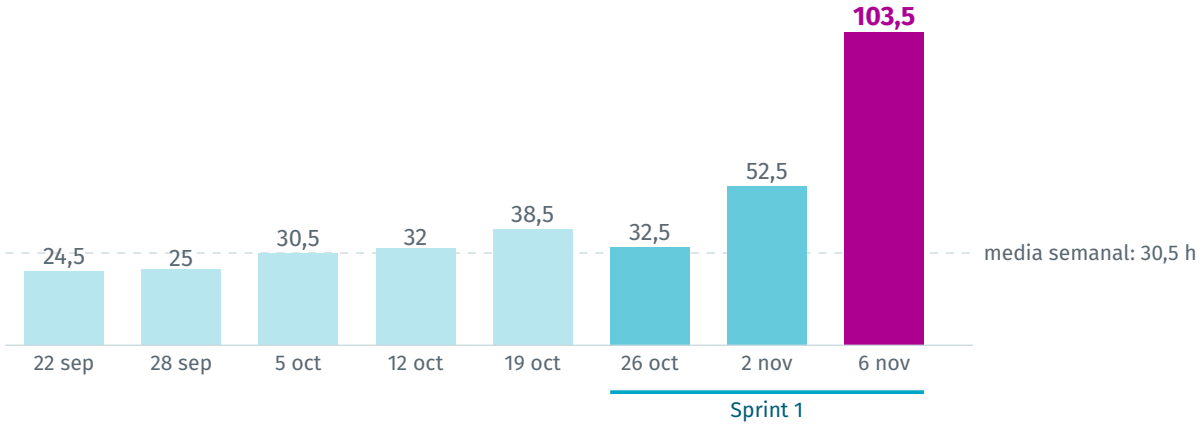

Horas semanales de todo el equipo, según el registro del documento de equipo.

Última semana

103,5 h

3,4 veces la media de las seis primeras semanas.

El 55 % del esfuerzo del sprint se hizo en sus últimos seis días.

El alcance no se repartió: se concentró

Las 14 historias nuevas y las 4 adelantadas entraron con el sprint ya en marcha. No se absorbieron redistribuyendo el trabajo a lo largo de las tres semanas, sino **acumulándolo al final**: cada persona dedicó una media de **14,8 horas en seis días**.

Es el mismo patrón que explica los conflictos de integración —todo se fusionó a la vez— y el motivo de los dos planes de mejora.

339 horas registradas en el proyecto desde el 22 de septiembre.

Integrante	Total	Última sem.	%
Pablo de la Torre Roldán	57,0	20,0	35
Yeray Rodríguez Navas	58,5	19,5	33
José Rodríguez Fernández	41,5	15,5	37
Pablo Hernández Ibáñez	60,0	14,0	23
Amine Azzammouri	36,0	14,0	39
Julián Carrión Tovar	44,0	12,5	28
Miguel Ángel Luque Gómez	42,0	8,0	19
Equipo	**339,0**	**103,5**	**31**

Qué nos costó

- **Integrar al final.** Backend y frontend fusionaron sus ramas tarde, y los conflictos obligaron a convocar reuniones urgentes.
- **Estimar con prisa.** Las 14 historias nuevas se estimaron sobre la marcha, mientras se creaban, sin margen para contrastarlas.
- **Las reuniones híbridas.** Cuando parte del equipo estaba presente y parte conectada, la conversación presencial se imponía y costaba intervenir desde casa.
- **Cuadrar horarios.** Otros proyectos y compromisos personales dificultaron encontrar huecos comunes.

Qué vamos a cambiar

Integrar de forma continua

Registrar en Jira las dependencias y responsables de cada historia *antes* de empezarla, y organizar sesiones de trabajo conjunto —preferiblemente presenciales— para fusionar backend y frontend de forma gradual, en lugar de esperar al cierre del sprint.

Reaccionar a los cambios de alcance

Cuando se incorpore o adelante una historia, revisar su estimación y medir el impacto en la capacidad del equipo. Se propone un informe que recoja qué se añadió, por qué, cuánto se estimó y qué se decidió.

Son propuestas, no acuerdos: se validan en la reunión de planificación del sprint 2, donde cada acción recibirá responsable y fecha de revisión.

Hacia el sprint 2

Alcance inicial planificado

53 PH

Frente a los 67 del sprint 1. Un arranque más prudente, a la espera de la sesión de planificación.

En qué se centra:

- Agenda completa y pasos guiados de actividad.
- Ajustes de accesibilidad por perfil de alumno.
- Validación con las personas usuarias del centro.
